



專案管理系統

操作手冊

目 錄

如何使用本手冊	錯誤! 尚未定義書籤。
一、R：填寫工作紀錄	錯誤! 尚未定義書籤。
二、A：撰寫並送出本週報告	錯誤! 尚未定義書籤。
三、A：審核 R 的回報完成 (確認 / 退回)	12
四、查看進度、狀態與甘特圖	15
五、查看更新紀錄	15
六、申請延期 (A)	16
七、審核延期 (S)	19
八、建立專案與開案 (PM)	20
九、查看通知	錯誤! 尚未定義書籤。

如何使用本手冊

本手冊以任務分章，逐步說明操作方式與各步驟的預期畫面；每個步驟預留截圖位置，可插入實際畫面。
系統的運作原理請參閱《流程說明》。

【開始前】

操作前，請先確認您在該專案的分工角色（R / A / S）；

不同角色可執行的操作不同（見《流程說明》第一章）。

一、R：填寫工作紀錄

「負責（R）」每週填寫工作紀錄，供「當責（A）」彙整為正式週報。填寫視窗上方有四個分頁：

分頁	內容
待完成	可填寫的任務（未回報、未完成，且已被指派）。工作紀錄在此分頁填寫。
待確認	已按「回報完成（無後續）」、等待 A 確認的任務。
完成區	A 已確認或已標記完成的任務（供存查）。
審視歷程	回報完成、取消回報、A 確認、A 退回等歷程紀錄。

● 步驟 1 進入「我的任務」填寫週報

登入後點選左側「我的任務」，找到要回報的專案，點「填寫週報」開啟視窗。



圖 1-1：我的任務頁，「填寫週報」入口

● 步驟 2 選擇填報週別

於視窗上方選擇「週別」（回報的所屬週）。



圖 1-2：週別選擇器

● 步驟 3 填寫工作內容（於「待完成」分頁）

展開任務，填寫「日期與工作內容」，可加入附件，或按「新增一列」填寫多筆；另可填寫「預計下週工作」（選填）。



待完成 待確認 完成區 審視歷程

開始 截止

需求分析與可行性評估

bbb 7/12 7/29 未填 ^

📅 本周工作紀錄（不限每天都要填，日期也不限當周）

日期	工作內容	附件
2026/07/01 📅	test	📎
📎 (暫含)OC... ✕		
+ 新增一列		

📅 預計下周工作 選填

預計下周要做什麼...

👍 回報完成 (無後續)

📤 提交週報

圖 1-3：任務展開、填寫日期與內容

● 步驟 4 提交週報

按「提交週報」，畫面顯示「週報已提交」提示，A 收到通知。




圖 1-4：提交後的「週報已提交」提示



圖 1-5：A 收到「週報已寄出」通知

● 步驟 5 (可選) 回報完成 (無後續)

若任務已完成、後續無須再回報，可按「回報完成 (無後續)」。按下後該任務移至「待確認」分頁，等待 A 確認，期間不再被催填週報；此為 R 的自我回報，任務的正式完成仍由 A 標記。如需修改，可於「待確認」分頁取消回報。



圖 1-5：「回報完成 (無後續)」按鈕



圖 1-6：送出後移至「待確認」分頁，等待 A 確認

【說明】 工作紀錄提交後，作為 A 撰寫正式報告的參考；進度與甘特圖於 A 送出報告後更新。

二、A：撰寫並送出本週報告

「當責 (A)」彙整內容並產出正式週報，用以更新官方進度。

● 步驟 1 開啟撰寫台、選擇週別

打開專案，點「撰寫本週報告」，於上方選擇週別；可先填「本週專案彙整說明」。




圖 2-1：撰寫台、週別與彙整說明

● 步驟 2 選擇要填寫的任務

於「選擇要填的項目」選一個任務，右側顯示該任務的填寫區與預計起訖日。



圖 2-2：選擇任務後的填寫區

● 步驟 3 (可選) 參考或匯入 R 的紀錄

如有 R 的紀錄，可按「查看 R 報告」或（父任務）「帶入子任務報告」匯入作為草稿，再自行編修。



圖 2-3：查看或匯入 R 報告

● 步驟 4 填寫報告內容

填寫「日期與內容」（可加附件）；報告日期用於推算任務進度。

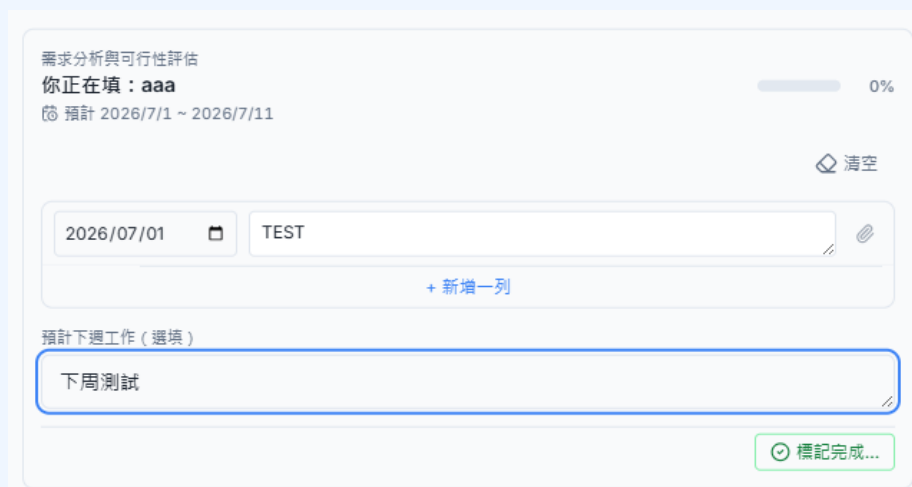


圖 2-4：A 填寫報告內容

● 步驟 5 (結案時) 標記完成

按該任務的「標記完成」，填寫「實際完成日」後確認；任務列顯示「將標記完成·日期」(送出後生效)。



圖 2-5：標記完成、填寫實際完成日

● 步驟 6 (可選) 暫存草稿

按「暫存草稿」保存內容(含待標記完成)；下次開啟內容仍在，可繼續編修。



圖 2-6：暫存草稿

● 步驟 7 送出本週報告

按「送出本週報告」，於確認視窗確認後送出；報告發布於「更新紀錄」並通知全員，進度更新，標記完成的任務更新為 100%，甘特圖同步。



圖 2-7：送出確認視窗

【說明】「送出本週報告」會發布並更新進度；「暫存草稿」僅保存內容。標記完成於送出後生效。

三、A：審核 R 的回報完成（確認／退回）

當 R 按「回報完成（無後續）」後，該任務進入待審核，由 A 確認或退回。

● 步驟 1 開啟待審核清單

A 於「我的任務」的週報審核區，看到 R 已回報、等待審核的任務，可展開查看 R 本週的工作紀錄（日期 / 內容 / 附件）。



圖 3-1：A 的週報審核佇列

● 步驟 2 審核通過

確認 R 的回報無誤後，按「審核通過」。系統認可 R 的報告並發布於「更新紀錄」；此動作不改變任務進度或完成度。通過後任務移至 R 的「完成區」。



圖 3-2 : A 審核通過



圖 3-3 : R 的「完成區」

● 步驟 3 退回 (駁回)

若需修正，按「退回」並填寫原因；任務退回給 R 重做，回到 R 的「待完成」分頁，R 會看到退回原因。



圖 3-4：退回並填寫原因

【審核通過 vs 標記完成】「審核通過」是認可 R 的回報並發布其紀錄；與 A 於撰寫台「標記完成」（設任務 100%）為不同動作，任務的正式完成以標記完成為準。

四、查看進度、狀態與甘特圖

● 步驟 1 進入「工作項目」分頁

打開專案，點「工作項目」，顯示甘特圖：任務長條、進度百分比、狀態燈、里程碑進度。

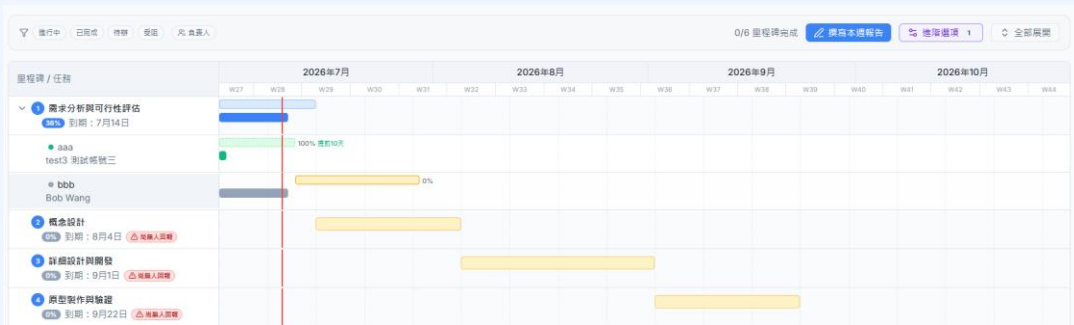


圖 4-1：工作項目（甘特圖）

● 步驟 2 狀態燈說明

狀態：待辦、進行中、逾期未開始、受阻、完成。任務進度依自身 A 報告；里程碑為其下所有任務的加權平均。

五、查看更新紀錄

● 步驟 1 進入「更新紀錄」分頁

打開專案，點「更新紀錄」，內容依週分組，呈現經 A 發布的報告與完成的任務。

The table displays update records for the week of 2026/7/6 to 7/12. It lists tasks and their completion status. The first task, '需求分析與可行性評估', is marked as '7/1 TEST'. The second task, 'aaa test3 測試帳號三', is marked as '7/1 完成'. The third task, 'bbb Bob Wang', is marked as '7/1 TEST'.

圖 5-1：更新紀錄（依週分組）

【說明】更新紀錄呈現經 A 發布的內容（A 送出的報告，及 A 審核通過的 R 回報）；未經 A 發布的紀錄不列示。完成的任務列於 A 送出報告的週別，並顯示實際完成日。

六、申請延期 (A)

當任務需調整時程時，由 A 提出延期申請，經 S 審核後生效。

● 步驟 1 點選「申請延期」

A 於撰寫台中，當系統顯示延期建議時，點「申請延期」。

The screenshot displays a task management interface. At the top, it shows the task title '需求分析與可行性評估' (Requirement Analysis and Feasibility Evaluation), the user '你正在填: bbb', and a progress bar at 0%. Below this, a date range '預計 2026/7/12 ~ 2026/7/29' is shown. There are two buttons: '查看 R 報告 1' (View R Report 1) and '清空' (Clear). A prominent orange warning box contains the text: '填報日期比規劃截止日晚了 1 天' (Reporting date is 1 day later than the planned deadline), '規劃截止 7/29, 此任務已逾期 (進度最高到 99%、無法標記完成)。建議送出延期申請調整時程。' (Planned deadline 7/29, this task is overdue (progress up to 99%, cannot be marked complete). Recommend submitting an extension application to adjust the schedule.). To the right of this box is a button labeled '申請延期' (Apply for Extension). Below the warning box is a table with two rows. The first row has a date '2026/07/01', a calendar icon, and the text 'TEST'. The second row has a date '2026/07/30', a calendar icon, and the text '測試延期' (Test Extension), which is highlighted with a black border. At the bottom of the table is a button labeled '+ 新增一列' (Add a new row).

2026/07/01	📅	TEST
2026/07/30	📅	測試延期

圖 6-1：延期提示與「申請延期」按鈕

● 步驟 2 填寫原因與新日期並送出

填寫延期原因與新日期；系統顯示受影響的任務範圍。確認後送出，S 收到通知。

26W28 (7/6 ~ 7/12) 本周

申請延期 · bbb

選擇新截止日，下方即時顯示影響。

目前截止 2026/7/29	新截止日 * 2026/07/30
-------------------	----------------------

ⓘ 這個日期會造成：

- 此任務延後 1 天
- 里程碑「需求分析與可行性評估」順延至 2026/7/15 (+1 天)
- 其後 5 個里程碑順延 1 天：「概念設計」「詳細設計與開發」「原型製作與驗證」「試產」「量產導入」

延期原因 *

測試延期

需要的支援 (選填)

需要協調的資源 / 人力...

取消 下一步：確認 →

圖 6-2：延期申請表單與影響預覽

【審核中的鎖定】送出後，該專案時程進入鎖定，待 S 完成審核（核准或駁回）後解除。

編輯專案

修改專案資訊。專案編號 (NPI-2026-012) 及日期範圍由里程碑決定，無法在此變更。

基本資訊

SMART

專案說明

團隊成員

風險管理

里程碑

此專案有延期申請審核中，為維持審核一致性，時程（里程碑/任務的新增、刪除、改名、日期、日曆天、拖曳、縮排、優先度）暫時鎖定；審核（核准或駁回）後即可編輯。目前僅「指派人員」可調整。

專案開始日期 *

專案結束日期

2026/07/01

2026/10/27

自動依里程碑計算

預覽甘特圖

全部展開

名稱	日曆天	開始日期	結束日期	指派人員	優先度
需求分析與可行性評估	2 任務 14	2026-07-01	2026-07-14		
概念設計	21	2026-07-15	2026-08-04		
詳細設計與開發	28	2026-08-05	2026-09-01		
原型製作與驗證	21	2026-09-02	2026-09-22		
試產	21	2026-09-23	2026-10-13		
量產導入	14	2026-10-14	2026-10-27		

取消

儲存變更

七、審核延期 (S)

● 步驟 1 進入「審核中心」

「審核 (S)」登入後點「審核中心」，顯示待審的延期申請。



圖 7-1：審核中心待審清單

● 步驟 2 查看影響並核准或駁回

可查看「延期影響」(受影響的任務延長與順延)。全部 S 核准後生效連動；任一 S 駁回則退回，時程不變。



圖 7-2：延期影響與核准 / 駁回


八、建立專案與開案（PM）

由 pm / admin 建立專案，設定里程碑、任務與團隊，規劃完成後「開案」正式啟動。

建立精靈可手動逐步輸入；過程中可隨時「儲存草稿」，之後「載入草稿」續填。

● 步驟 1 開啟「建立新專案」

於「專案看板」點右上「建立新專案」，進入建立精靈。上方分頁依序為：基本資訊、SMART 目標、專案定義、團隊與風險、時程里程碑。

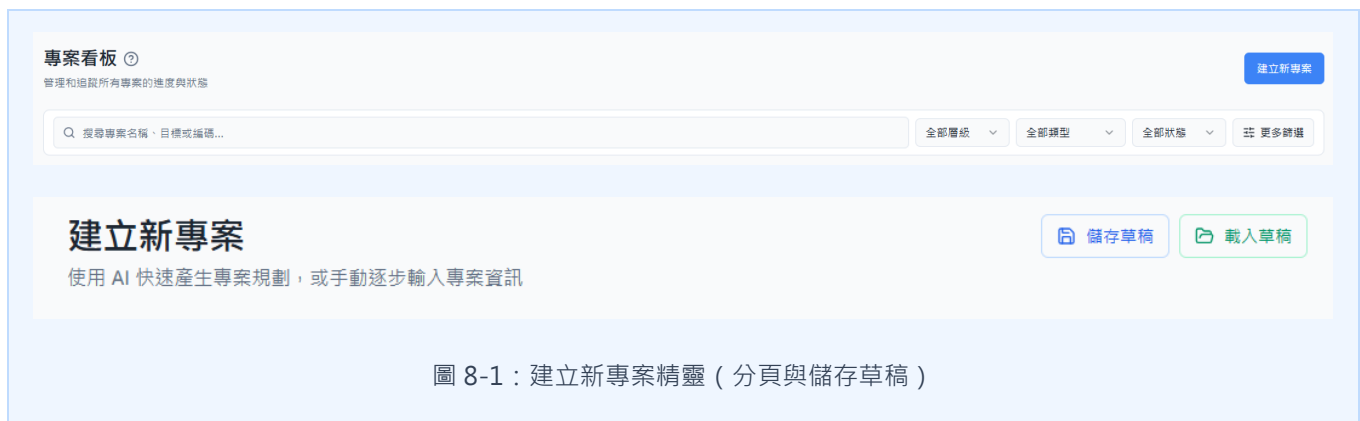

● 步驟 2 基本資訊、SMART 目標、專案定義

填寫專案名稱、類型、開始日期等基本資訊，並設定 SMART 目標與專案定義（背景、範圍）。此處亦可使用「AI 快速產生專案規劃」帶入初稿後再調整。

建立新專案

使用 AI 快速產生專案規劃，或手動逐步輸入專案資訊

保存草稿

載入草稿

基本資訊

SMART 目標

專案定義

團隊與風險

時程里程碑

基本資訊

填寫專案的基本特徵與分類資訊

專案類別 *

選擇專案類別

需求來源 *

選擇需求來源

專案類型 *

選擇專案類型

專案代碼預覽

選擇類型後自動產生

專案名稱 *

輸入專案名稱

投資預算 (NT\$)

5000000

投資設備清單 (選擇)

有設備清單時，預算由 AI 解析的合計金額帶入

點擊展開 / 新增設備清單

AI 解析

貼上

新增

專案原因 *

說明開立此專案的原因或背景

取消

下一步

基本資訊

SMART 目標

專案定義

團隊與風險

時程里程碑

SMART 目標

依據 SMART 原則設定專案目標（具體、可衡量、可達成、相關性、時限性）

S 具體目標 (Specific) *

具體要達成什麼？例如：開發一套客戶關係管理系統，整合現有 3 個獨立的客戶資料庫

M 可衡量指標 (Measurable) *

如何衡量成功？例如：提升客戶資料查詢效率 50%，減少資料重複率至 5% 以下

A 可達成性 (Achievable) *

有這些資源和能力支持？例如：現有 IT 團隊 5 人、預算 500 萬、已有技術架構基礎

R 相關性 (Relevant) *

與組織目標的關聯？例如：支持公司 2026 年業績成長 30% 的戰略目標

T 時限性 (Time-bound) *

預期完成時間？例如：2026 年 Q2 完成開發，Q3 上線運行

圖 8-2：基本資訊與 SMART 目標

專案管理系統 · 操作手冊 — 第 21 頁

● 步驟 3 團隊與風險

加入團隊成員並指定角色 (R / A / S / C / I / P)，並登錄專案風險。後續指派任務時，僅能從團隊成員中選擇。

建立新專案

儲存草稿 載入草稿

使用 AI 快速產生專案規劃，或手動逐步輸入專案資訊

基本資訊

SMART 目標

專案定義

團隊與風險

時程里程碑

團隊與風險

組建專案團隊並預先識別潛在風險

團隊成員 *

組建專案團隊，輸入姓名按 Enter 即可新增 (至少需要一位成員)

姓名	職稱	組織	角色	負責工作項目
+ 新增成員...				
共 0 位成員				

風險識別

預先識別專案可能面臨的風險，評估影響程度和發生機率

+ 點擊新增風險項目

← 上一步

下一步 >

圖 8-3：團隊成員與角色設定

● 步驟 4 時程與里程碑（結構編輯）

於「時程里程碑」分頁建立里程碑與任務的階層結構。每一列可填寫：名稱、日曆天、開始 / 結束日期、指派人、優先度；日期以手動輸入為準。結構的建立與調整方式如下：

- **新增：**點「新增里程碑」加入里程碑；於里程碑下點「+ 新增任務」加入任務；於任務列可再新增子任務。
- **縮排 / 升階：**按任務列的「縮排」，將其變為上一列項目的子項（往下一層）；按「升階」則往上提一層（子任務→任務，或任務→里程碑）。
- **拖曳調整：**拖曳每列左側的握把，可調整順序，或改變層級（例如將任務拖入另一任務成為子任務）；拖曳過程中日期保留不變。
- **里程碑降階：**可將里程碑「降階」為相鄰里程碑底下的任務。
- **階層上限：**最多 6 層（里程碑 + 最多 5 層任務）。

時程與里程碑

設定專案時間範圍與關鍵里程碑

開始日期

年 / 月 / 日

結束日期

年 / 月 / 日

已根據「成本優化」自動帶入 5 個里程碑範本。可直接在表格中編輯名稱、期程，或在每個里程碑下方快速新增任務。

拖動左側圖標可改變順序。輸入天數後系統自動計算日期。專案結束日期會根據里程碑自動調整。

預覽甘特圖

全部收合

名稱	日曆天	開始日期	結束日期	指派人	優先度
現況分析與成本拆解 + 新增任務...					
優化方案擬定 + 新增任務...					
供應商談判/方案執行 + 新增任務...					
驗證與效果評估 + 新增任務...					
標準化與持續追蹤 + 新增任務...					
+ 新增里程碑					

← 上一步

✓ 建立專案

圖 8-4：時程里程碑—新增、縮排 / 升階、拖曳調整

● 步驟 5 建立專案

確認結構後按「建立專案」。專案出現在看板，狀態為「草稿」；被指派者收到「任務指派」通知。

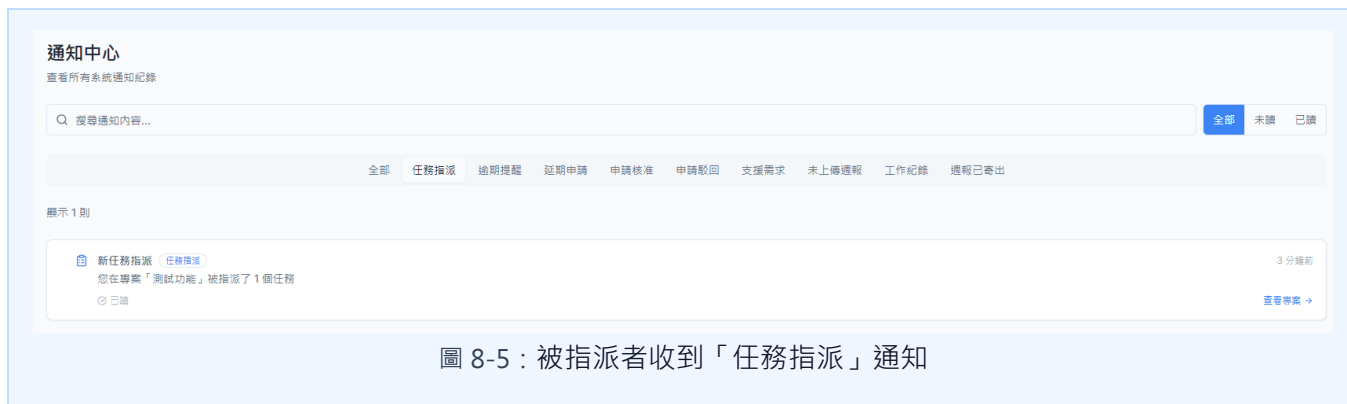


圖 8-5：被指派者收到「任務指派」通知

● 步驟 6 開案

規劃確定、要正式執行時，打開專案點「開案」，狀態由「草稿」變為「已開案」。開案後，時程調整需經延期審核，系統並開始發送逾期與催繳通知。

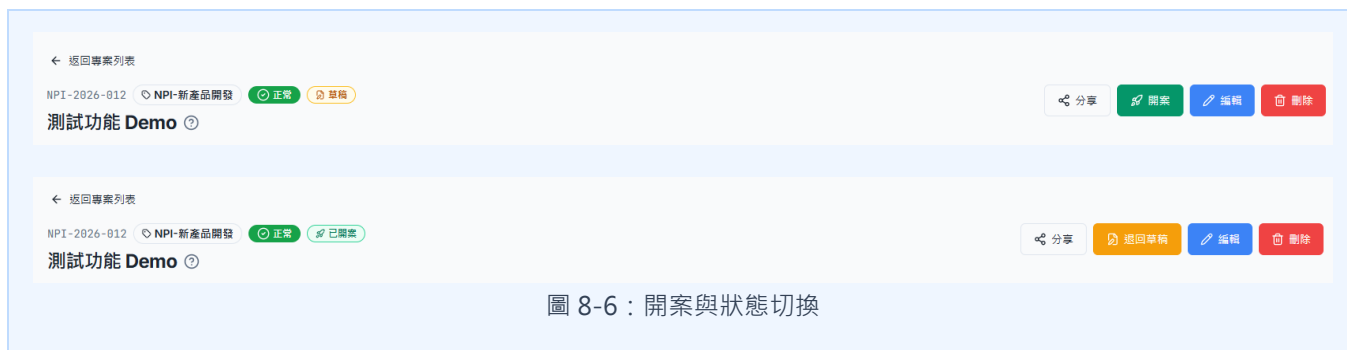


圖 8-6：開案與狀態切換

【開案的作用】 開案前為「草稿」，可自由調整；開案後日期定版，調整需經延期審核。

八、查看通知

● 步驟 1 點選右上角通知鈴

通知於動作發生後約 10 秒內自動顯示；切換分頁後返回亦會即時更新。點鈴鐺可展開，點「查看所有通知」檢視完整清單。

通知	觸發時機	對象	類型
任務指派	建立 / 編輯指派任務	被指派者	即時
新增工作紀錄	R 送出工作紀錄	A 當責 (每天每專案最多 1 則)	即時
週報已送出	A 送出本週報告	全體團隊	即時
延期申請	送出延期申請	S 審核	即時
審核結果	S 完成審核	申請人	即時
逾期提醒	里程碑逾期 (每 7 天 1 則)	A 當責	排程·限已開案
週報催繳	本週應填未填	當事 R	排程·限已開案

通知中心

查看所有系統通知紀錄

50 未讀

全部標為已讀

Q 搜尋通知內容...

全部 未讀 已讀

全部 48 任務指派 逾期提醒 2 延期申請 20 申請核准 申請駁回 支援需求 3 未上傳週報 40 工作紀錄 週報已寄出 1

顯示 96 則，其中 86 則未讀

延期申請待審核 延期申請

Alice Chen 提出延期申請 (專案：測試功能 Demo)，請前往審核

標為已讀

5 分鐘前

查看專案 →

本週報告已送出 週報已寄出

Alice Chen 送出了「測試功能 Demo」的本週報告 (2026-07-06)，可查看更新紀錄

標為已讀

8 分鐘前

查看專案 →

圖 8-1：通知鈴與通知中心

【說明】逾期提醒與週報催繳屬排程通知，僅對已開案專案發送。
