新增功能確認：里程碑日期標記、複製專案、總覽匯出 Excel

專案管理系統 ｜ 版本 v2.0 ｜ 日期 2026-10-11 ｜ 狀態：待確認，確認後上線

本版在 v1.0 的兩項功能之外，新增「總覽匯出 Excel」，並依試用回饋調整了圖表的標示方式。

v1.0 → v2.0 變更摘要

項目	這一版的變化
三、總覽匯出 Excel	新增 里程碑階段總覽可匯出成可編輯的 Excel，供貼進 PPT 報告或自行調整
圖表標示方式	調整 「Plan / Actual」改為中文「計畫 / 實際」；圖例增加「淡色＝計畫區間、實心＝實際進度」的說明
里程碑長條	修正 未填開始日的里程碑，甘特圖上長條會縮成一小段；已改為自動採用底下任務的最早開始日
一、日期標記 **二、複製專案**	內容與 v1.0 相同，無異動

一、里程碑總覽：任務日期標記

需求：讓主管在時程表上直接看出里程碑裡關鍵任務的完成時間點，不必再點進去查。

1-1　誰能設定、誰看得到

角色	可以做什麼
當責（A）、專案經理、系統管理員	看得到「顯示設定」按鈕，可勾選要標註的任務與呈現方式
主管與其他成員	看不到設定按鈕；直接套用當責設定好的畫面，不會也不能更動

【設定檔】當責的設定存在伺服器、每個專案一份，不是存在個人電腦。換一台電腦或換人開啟，看到的都是同一份設定。

1-2　當責怎麼設定

步驟 1　點右上角「顯示設定」。設定分成三個分頁：**版面**（排列與縮放）、**日期標記**（要標哪些任務）、**顯示階段**（哪些階段要出現）。

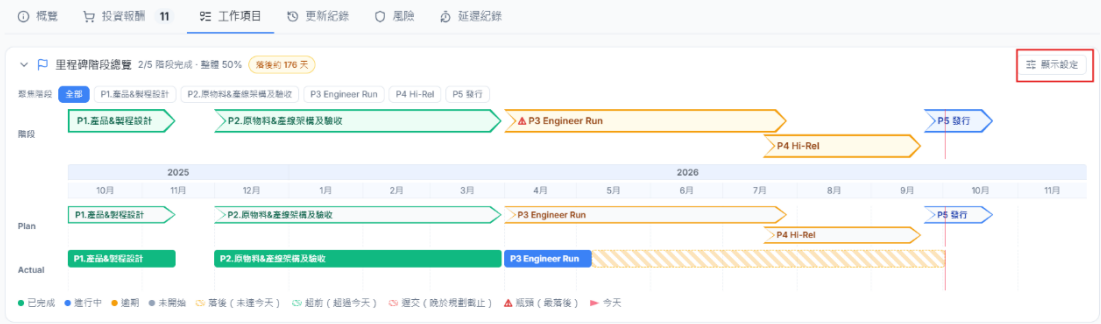


圖 1-1：「顯示設定」按鈕位置

步驟 2　在「日期標記」分頁選擇要標的日期種類：

選項	標出來的是什麼
實際完成	任務真正完成的日期。只標已完成的任務，未完成不會出現
計畫完成	任務預定的結束日，不論完成與否
兩者	兩種都標，可比對計畫與實際的落差



圖 1-2：「日期標記」分頁：日期種類與任務勾選清單

步驟 3　勾選要標註的任務。清單依里程碑分組，尚未完成的任務會標示「未完成」，提醒您選「實際完成」時這筆不會顯示。勾選後立即儲存，主管重新整理即可看到。

1-3　主管看到的畫面

勾選的任務會在「計畫 / 實際」長條上出現一條細標記，旁邊顯示日期：**實心紫線 = 實際完成、虛線淡紫 = 計畫完成。**滑鼠移上去會顯示完整的任務名稱與日期。



圖 1-3：里程碑總覽上的日期標記

【為什麼日期只顯示月 / 日】長條上可能同時有好幾個標記，顯示完整日期會互相重疊。因此標籤採月 / 日並上下交錯排列，完整日期在滑鼠移上時顯示。

1-4　看不清楚時：聚焦單一階段

整個專案橫跨一年以上時，標記會擠在一起。總覽上方有「聚焦階段」一列，點任一階段即可把時間軸收斂到該階段，刻度自動從「月」改為「日期」。再點一次或按「全部」即可還原。

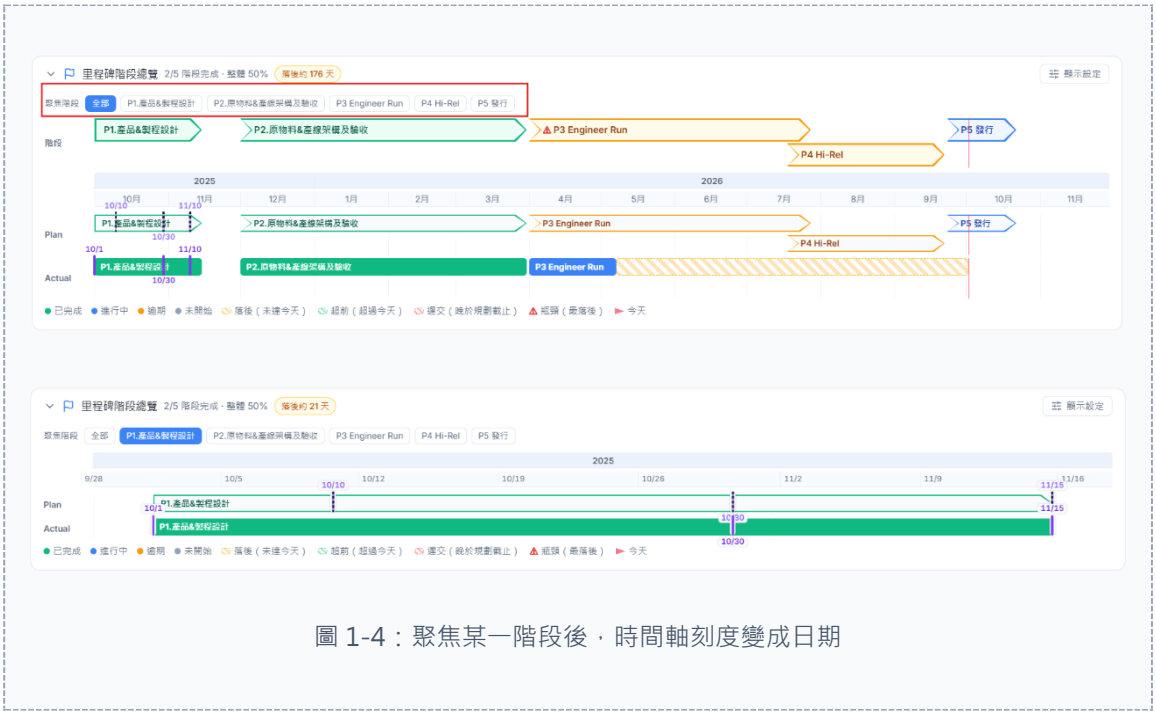


圖 1-4：聚焦某一階段後，時間軸刻度變成日期

【這是臨時檢視】聚焦不會存檔，只影響當下這次瀏覽。避免當責聚焦查看後忘記還原，導致主管隔天只看得到其中一段。

二、複製專案

需求：建立性質相近的新專案時，不必從零重新輸入里程碑與任務。

2-1　誰能使用

僅限**系統管理員與專案經理**。一般成員的畫面不會出現任何複製入口——複製會一次產生整組里程碑與任務，開放給所有人會讓專案清單被重複的專案灌爆。

2-2　兩個入口

入口	使用時機
專案看板右上角 **「複製現有專案」**	還不確定要複製哪一個，按下後從清單挑選
專案卡片下方 **「以此專案為範本」**	已經看到想複製的那張卡片，直接按



圖 2-1：兩個入口：頁首按鈕與卡片按鈕

2-3　選擇要複製的內容

基本資料（名稱、目標、類型、層級、期間）一律複製，其餘自行勾選：

項目	說明
里程碑與任務（預設勾選）	含子任務與層級結構。進度與完成狀態會歸零，只保留架構與計畫日期
團隊成員	含角色與報告審核主管設定。不勾選時任務不會帶指派人，避免指派給不在新團隊的人
SMART 與投資報酬	目標描述、預期效益、ROI 欄位
投資設備清單	站別、廠商、組數與預估金額。實際花費不複製
採購明細	CAPEX 逐筆資料
風險	風險描述、影響程度、因應對策



圖 2-2：複製專案對話框：名稱與勾選項目

【不會複製的內容】工作紀錄、週報、延期申請、審核歷程屬於執行過程，不會帶到新專案。新專案的專案編號自動產生，且一律是**草稿**狀態——確認內容無誤後再自行開案。

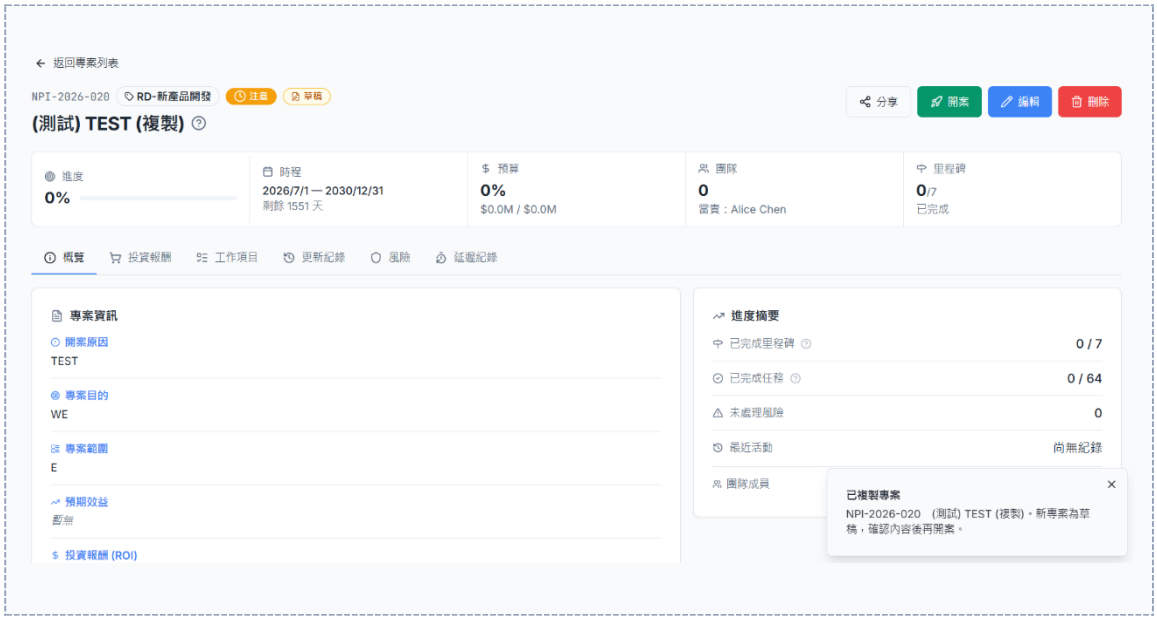


圖 2-3：複製完成後自動開啟的新專案

三、總覽匯出 Excel 本版新增

需求：希望里程碑階段總覽這一塊可以匯出成 Excel，讓人自行編輯後貼到自己的 PPT 報告。

3-1　入口與範圍

里程碑階段總覽右上角、「顯示設定」左邊，有一顆**「匯出 Excel」**按鈕。所有看得到總覽的人都可以匯出。

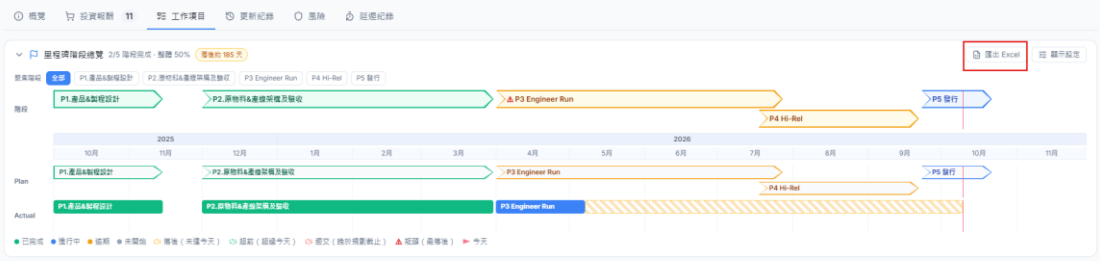


圖 3-1：「匯出 Excel」按鈕位置（在「顯示設定」左邊）

【單向匯出】匯出後在 Excel 上的修改**不會回寫系統**。Excel 檔是給報告用的副本，系統裡的資料仍以網頁上的為準。

3-2　匯出的檔案內容

一個 Excel 檔，依用途分成四種工作表：

工作表	一格代表	用途
階段總覽	一週	整個專案一眼看完。寬度控制在可直接貼進 PPT 的範圍
各階段細節（每個階段一張）	**一天**	看確切是哪一天。每個任務自己一列，含負責人、計畫起迄、實際完成日
階段彙總	—	階段層級的表格版，要自己做圖或算數字時用
任務明細	—	一列一個任務的平表，**已掛好篩選器**。要篩選、排序、拉樞紐分析在這張做

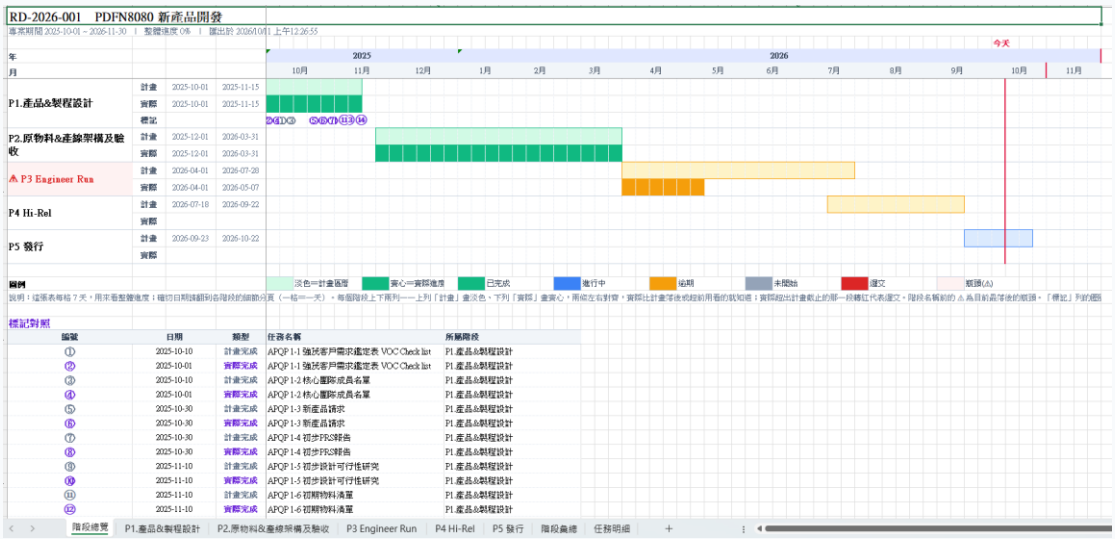


圖 3-2：匯出檔案下方的工作表分頁

【為什麼要分成一週與一天兩種】Excel 的一欄固定代表一段時間，沒有「縮放」這回事。整個專案若做成一格一天會超過 380 欄，欄寬被迫壓到 5 像素，既調不動、標記也全擠在一起；但一格一週又看不出長條確切落在哪一天。因此總覽維持一格一週供整體閱讀，確切日期放在各階段的細節分頁。

3-3　怎麼讀圖

兩種圖表分頁用**同一套**讀法：每個項目上下兩列，**上列「計畫」畫淡色、下列「實際」畫實心**，兩條左右對齊，實際比計畫落後或超前用看的就知道。

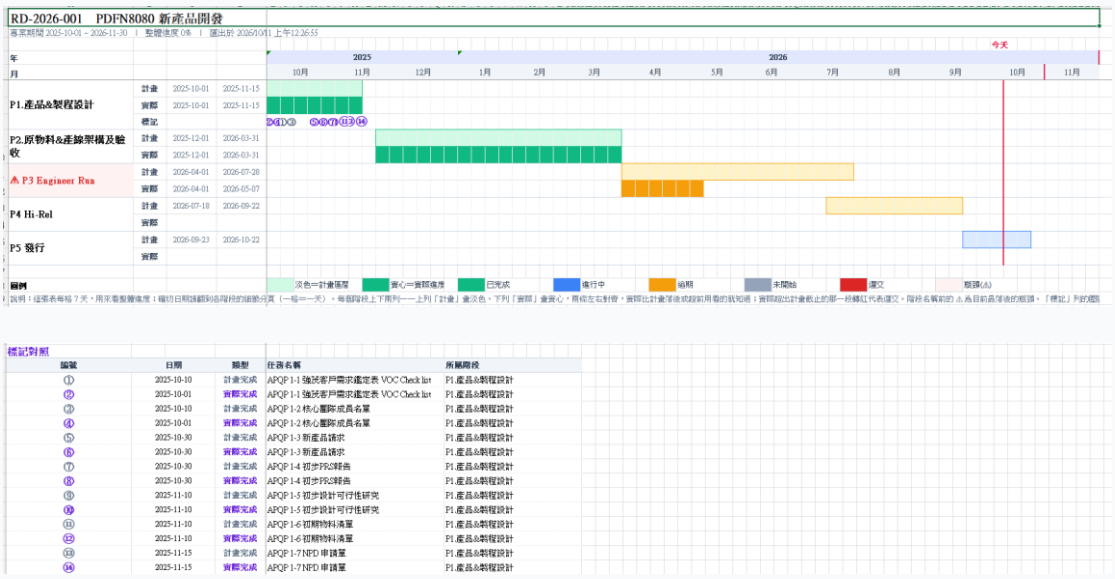


圖 3-3：階段總覽（一格一週）：計畫 / 實際兩列與底部圖例

畫面上的標示	意思
淡色長條	計畫區間。顏色代表狀態：綠 = 已完成、藍 = 進行中、橘 = 逾期、灰 = 未開始
實心長條	實際進度。已完成畫到實際完成日；未完成畫到目前進度換算的位置
紅色段	遲交——實際超出計畫截止的那一段。「結束」欄會註明遲幾天
階段名稱前的 ⚠	目前最落後的瓶頸階段（與網頁上的判定一致）
紅色直線	今天

日期列灰底	週末（僅各階段細節分頁）

每張圖表分頁底部都有色塊圖例，不需要對照本文件也看得懂。


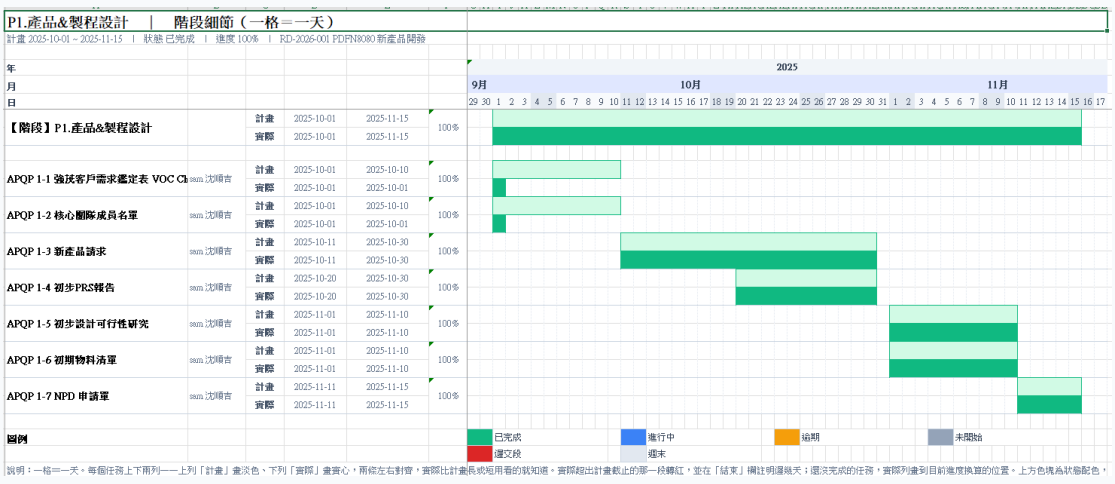


圖 3-4：某一階段的細節分頁（一格一天）

3-4　日期標記怎麼呈現

第一節當責勾選的日期標記會一併帶進「階段總覽」，以圈號 ①②③ 標在時間軸上，完整內容列在下方的**「標記對照」**表（編號、日期、類型、任務名稱、所屬階段）。灰色 = 計畫完成、紫色 = 實際完成。



標記對照

編號	日期	類型	任務名稱	所屬階段
①	2025-10-10	計畫完成	APQP 1-1 強效客戶需求鑑定表 VOC Check list	P1.產品&製程設計
②	2025-10-01	實際完成	APQP 1-1 強效客戶需求鑑定表 VOC Check list	P1.產品&製程設計
③	2025-10-10	計畫完成	APQP 1-2 核心團隊成員名單	P1.產品&製程設計
④	2025-10-01	實際完成	APQP 1-2 核心團隊成員名單	P1.產品&製程設計
⑤	2025-10-30	計畫完成	APQP 1-3 新產品請求	P1.產品&製程設計
⑥	2025-10-30	實際完成	APQP 1-3 新產品請求	P1.產品&製程設計
⑦	2025-10-30	計畫完成	APQP 1-4 初步PRS報告	P1.產品&製程設計
⑧	2025-10-30	實際完成	APQP 1-4 初步PRS報告	P1.產品&製程設計
⑨	2025-11-10	計畫完成	APQP 1-5 初步設計可行性研究	P1.產品&製程設計
⑩	2025-11-10	實際完成	APQP 1-5 初步設計可行性研究	P1.產品&製程設計
⑪	2025-11-10	計畫完成	APQP 1-6 初期物料清單	P1.產品&製程設計
⑫	2025-11-10	實際完成	APQP 1-6 初期物料清單	P1.產品&製程設計
⑬	2025-11-15	計畫完成	APQP 1-7 NPD 申請單	P1.產品&製程設計
⑭	2025-11-15	實際完成	APQP 1-7 NPD 申請單	P1.產品&製程設計

圖 3-5：階段總覽下方的「標記對照」表

【確切日期以對照表為準】總覽一格代表一週，圈號只表示大約落在哪一週。要確切日期請看對照表，或翻到該階段的細節分頁。

3-5　要篩選、排序請用「任務明細」

圖表分頁為了好讀使用了合併儲存格（任務名稱跨「計畫 / 實際」兩列），而 Excel 的篩選是以**列**為單位——合併範圍被篩選時只會保留第一列，篩出來會變成只剩計畫、實際整條消失。因此**請勿在圖表分頁上使用篩選**。

需要篩選時請用「任務明細」分頁，該表沒有任何合併、標題只有一列、篩選器已掛好：

欄位	說明
階段、層級	層級分為**里程碑 / 任務 / 子任務 L2…**，可只篩里程碑看大節點，或只篩子任務看執行細節
任務名稱、上層任務	子任務會標出所屬的上層任務
負責人	可篩出單一人員的所有任務
計畫開始 / 結束 / 天數	計畫值
實際完成日	尚未完成則留空
與計畫差（天）	**正數 = 遲交**、**負數 = 提前**、0 = 準時
遲交	遲交的標「是」，可一鍵篩出所有遲交項目
狀態、進度%	與網頁一致
總覽標記	當責在第一節勾選標註的任務標「是」

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	階段	計畫開始	計畫結束	計畫天	狀態	進度%	實際完成	與計畫差(天)
2	P1.產品&製程設計	2025-10-01	2025-11-15	46	已完成	100	2025-11-15	0
3	P2.原物料&產線架構及驗收	2025-12-01	2026-03-31	121	已完成	100	2026-03-31	0
4	P3 Engineer Run	2026-04-01	2026-07-28	119	逾期	31	2026-06-19	-39
5	P4 Hi-Rel	2026-07-18	2026-09-22	67	逾期	0		
6	P5 發行	2026-09-23	2026-10-22	30	進行中	0		
7								
8	任務日期標記							
9	所屬階段	類型	日期	任務名稱				
10	P1.產品&製程設計	實際完成	2025-10-01	APQP 1-1 強茂客戶需求鑑定表 VOC Check list				
11	P1.產品&製程設計	計畫完成	2025-10-10	APQP 1-1 強茂客戶需求鑑定表 VOC Check list				
12	P1.產品&製程設計	實際完成	2025-10-01	APQP 1-2 核心團隊成員名單				
13	P1.產品&製程設計	計畫完成	2025-10-10	APQP 1-2 核心團隊成員名單				
14	P1.產品&製程設計	實際完成	2025-10-30	APQP 1-3 新產品請求				
15	P1.產品&製程設計	計畫完成	2025-10-30	APQP 1-3 新產品請求				
16	P1.產品&製程設計	實際完成	2025-10-30	APQP 1-4 初步PRS報告				
17	P1.產品&製程設計	計畫完成	2025-10-30	APQP 1-4 初步PRS報告				
18	P1.產品&製程設計	實際完成	2025-11-10	APQP 1-5 初步設計可行性研究				
19	P1.產品&製程設計	計畫完成	2025-11-10	APQP 1-5 初步設計可行性研究				
20	P1.產品&製程設計	實際完成	2025-11-10	APQP 1-6 初期物料清單				
21	P1.產品&製程設計	計畫完成	2025-11-10	APQP 1-6 初期物料清單				
22	P1.產品&製程設計	實際完成	2025-11-15	APQP 1-7 NPD 申請單				
23	P1.產品&製程設計	計畫完成	2025-11-15	APQP 1-7 NPD 申請單				
24								
25								

階段	層級	任務名稱	上層任務	負責人	計畫開始	計畫結束	計畫天	實際完成	與計畫差	逾交	狀態	進度%	總覽標
P1.產品&製程設計	**里程碑**	**P1.產品&製程設計**			**2025-10-01**	**2025-11-15**	**46**	**2025-11-15**	**0**		**已完成**	**100**	
P1.產品&製程設計	任務	APQP 1-1 強茂客戶需求鑑定表 VOC Check list		sam 沈順吉	2025-10-01	2025-10-10	10	2025-10-01	-9		已完成	100	是
P1.產品&製程設計	任務	APQP 1-2 核心團隊成員名單		sam 沈順吉	2025-10-01	2025-10-10	10	2025-10-01	-9		已完成	100	是
P1.產品&製程設計	任務	APQP 1-3 新產品請求		sam 沈順吉	2025-10-11	2025-10-30	20	2025-10-30	0		已完成	100	是
P1.產品&製程設計	任務	APQP 1-4 初步PRS報告		sam 沈順吉	2025-10-20	2025-10-30	11	2025-10-30	0		已完成	100	是
P1.產品&製程設計	任務	APQP 1-5 初步設計可行性研究		sam 沈順吉	2025-11-01	2025-11-10	10	2025-11-10	0		已完成	100	是
P1.產品&製程設計	任務	APQP 1-6 初期物料清單		sam 沈順吉	2025-11-01	2025-11-10	10	2025-11-10	0		已完成	100	是
P1.產品&製程設計	任務	APQP 1-7 NPD 申請單		sam 沈順吉	2025-11-11	2025-11-15	5	2025-11-15	0		已完成	100	是
P2.原物料&產線架構及驗收	**里程碑**	**P2.原物料&產線架構及驗收**			**2025-12-01**	**2026-03-31**	**121**	**2026-03-31**	**0**		**已完成**	**100**	
P2.原物料&產線架構及驗收	任務	APQP P2		sam 沈順吉	2025-12-01	2026-03-31	121	2026-03-31	0		已完成	100	
P2.原物料&產線架構及驗收	子任務 L2	APQP 2-1 開發里程碑與計畫表	APQP P2		2025-12-01	2025-12-10	10	2025-12-10	0		已完成	100	
P2.原物料&產線架構及驗收	子任務 L2	APQP 2-2 產品矩陣定義	APQP P2		2025-12-11	2025-12-20	10	2025-12-19	-1		已完成	100	
P2.原物料&產線架構及驗收	子任務 L2	APQP 2-3 初步製程流程圖	APQP P2		2025-12-11	2025-12-31	21	2025-12-30	-1		已完成	100	
P2.原物料&產線架構及驗收	子任務 L2	APQP 2-4 試製品DFMEA	APQP P2		2025-12-11	2025-12-31	21	2025-12-30	-1		已完成	100	
P2.原物料&產線架構及驗收	子任務 L2	APQP 2-5 試製品PFMEA	APQP P2		2025-12-11	2025-12-31	21	2025-12-31	0		已完成	100	
P2.原物料&產線架構及驗收	子任務 L2	APQP 2-6 試製品控制計劃	APQP P2		2026-01-01	2026-01-20	20	2026-01-19	-1		已完成	100	
P2.原物料&產線架構及驗收	子任務 L2	APQP 2-7 產品風險評估	APQP P2		2026-01-11	2026-01-30	20	2026-01-30	0		已完成	100	
P2.原物料&產線架構及驗收	子任務 L2	APQP 2-8 試製品驗證計劃	APQP P2		2026-01-21	2026-02-10	21	2026-02-10	0		已完成	100	
P2.原物料&產線架構及驗收	子任務 L2	APQP 2-9 LAR報告	APQP P2		2026-02-01	2026-02-10	10	2026-02-10	0		已完成	100	
P2.原物料&產線架構及驗收	子任務 L2	APQP 2-10 最終產品需求規格書	APQP P2		2026-02-01	2026-02-10	10	2026-02-10	0		已完成	100	
P2.原物料&產線架構及驗收	子任務 L2	APQP 2-11 設計報告	APQP P2		2026-02-11	2026-02-20	10	2026-02-19	-1		已完成	100	
P2.原物料&產線架構及驗收	子任務 L2	APQP 2-12 新產品原物料	APQP P2		2026-02-01	2026-02-20	20	2026-02-20	0		已完成	100	
P2.原物料&產線架構及驗收	子任務 L2	APQP 2-13 晶片供應商製程確認	APQP P2		2026-02-11	2026-02-20	10	2026-02-20	0		已完成	100	
P2.原物料&產線架構及驗收	子任務 L2	APQP 2-14 封裝設計說明與Package code準則定	APQP P2		2026-02-21	2026-03-10	18	2026-03-10	0		已完成	100	
P2.原物料&產線架構及驗收	子任務 L2	APQP 2-15 新產品開發風險評估表	APQP P2		2026-03-11	2026-03-20	10	2026-03-20	0		已完成	100	
P2.原物料&產線架構及驗收	子任務 L2	APQP 2-16 新產品HSF有害物質確認表	APQP P2		2026-03-01	2026-03-10	10	2026-03-10	0		已完成	100	
P2.原物料&產線架構及驗收	子任務 L2	APQP 2-17 工程試作申請單	APQP P2		2026-03-01	2026-03-10	10	2026-03-10	0		已完成	100	
P2.原物料&產線架構及驗收	子任務 L2	APQP 2-18 初版打線圖/測試規格 (包含產品線	APQP P2		2026-03-11	2026-03-20	10	2026-03-20	0		已完成	100	
P2.原物料&產線架構及驗收	子任務 L2	APQP 2-19 包裝規範(初版)	APQP P2		2026-03-11	2026-03-20	10	2026-03-20	0		已完成	100	
P2.原物料&產線架構及驗收	子任務 L2	APQP 2-20 Qualification Plan	APQP P2		2026-03-11	2026-03-20	10	2026-03-20	0		已完成	100	
P2.原物料&產線架構及驗收	子任務 L2	APQP 2-21 能源審查鑑別表-用能設備	APQP P2		2026-03-11	2026-03-31	21	2026-03-31	0		已完成	100	
P2.原物料&產線架構及驗收	子任務 L2	APQP 2-22 能源管理使用設備採購規格表	APQP P2		2026-03-11	2026-03-31	21	2026-03-31	0		已完成	100	
P2.原物料&產線架構及驗收	子任務 L2	APQP2-23 環境物質評估表	APQP P2		2026-03-11	2026-03-31	21	2026-03-31	0		已完成	100	
P3 Engineer Run	**里程碑**	**P3 Engineer Run**			**2026-04-01**	**2026-07-28**	**119**	**2026-06-19**	**-39**		**逾期**	**31**	
P3 Engineer Run	任務	APQP P3		sam 沈順吉	2026-04-01	2026-06-20	81				逾期	0	
P3 Engineer Run	子任務 L2	APQP 3-1 生產流程圖	APQP P3	sam 沈順吉	2026-04-01	2026-04-10	10	2026-04-10	0		已完成	100	
P3 Engineer Run	子任務 L2	APQP 3-2 DFMEA設計失效模式與影響分析	APQP P3	sam 沈順吉	2026-04-11	2026-05-10	30	2026-05-08	-2		已完成	100	
P3 Engineer Run	子任務 L2	APQP 3-3 PFMEA過程失效模式及效應分析	APQP P3	sam 沈順吉	2026-04-21	2026-05-20	30	2026-05-20	0		已完成	100	
P3 Engineer Run	子任務 L2	APQP 3-4 Production Control Plan	APQP P3	sam 沈順吉	2026-05-01	2026-05-30	30	2026-05-29	-1		已完成	100	
P3 Engineer Run	子任務 L2	APQP 3-5 初步產品數據表	APQP P3	sam 沈順吉	2026-05-21	2026-05-31	11				逾期	0	
P3 Engineer Run	子任務 L2	APQP 3-6 移交報告 Handover report	APQP P3	sam 沈順吉	2026-05-21	2026-05-31	11				逾期	0	
P3 Engineer Run	子任務 L2	APQP 3-7 M&A 分析報告	APQP P3	sam 沈順吉	2026-05-21	2026-06-09	20	2026-06-09	0		已完成	100	

階段總覽 | P1.產品&製程設計 | P2.原物料&產線架構及驗收 | P3 Engineer Run | P4 Hi-Rel | P5 發行 | 階段彙總 | 任務明細 | +

圖 3-6：「任務明細」分頁與篩選器
